

苏州苏德兰铁路配件有限公司

盐雾试验报告


单位名称：苏州苏德兰铁路配件有限公司
Supplier: Suzhou Sudelan Railway parts Co. Ltd

产品名称 Product Name	螺纹道钉 Screw Spike	样品数量 Sample Qty	2pcs	产品规格 Product size	25×219
批次号 Batch no.	/	检测日期 Inspection Period	from 10am 3/9/2025 to 16:00pm 11/9/2025		

检测类型：NSS试验
Inspection Type = NSS Test

检验评级：ISO4042
Inspection Standards: ISO 4042

产品特征描述：表面完好无缺陷，电镀锌
Production Description: Appearance intact no defect, electroplated zinc

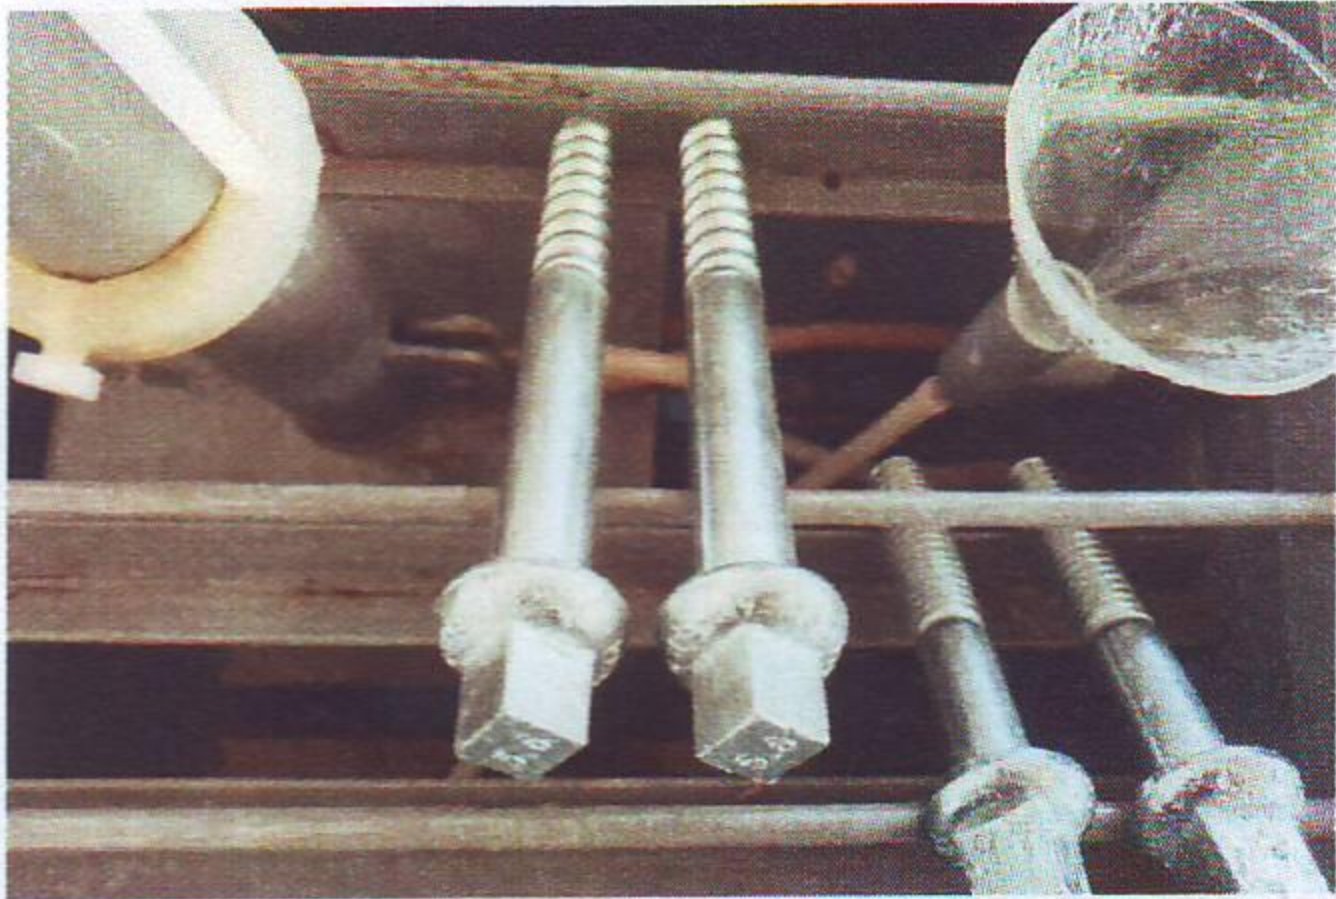


检测结果/数据
Test Result and Test Data

试验溶液 Test solvent	5%NaCl溶液 5% NaCl	溶液密度 Solvent Density	1.033	溶液PH值 Solvent pH Value	7
实验温度 Test Chamber Temp	35℃	试验周期 Test Duration	200h	喷雾方式 Spray method	连续 Continuous spraying
试验仪器 Test Machine	Model R90		仪器编号 Machine Serial No.		088-20

试验后观察结果：无红锈
Test result = No red rust

96h无白锈
Photo showing no white rust

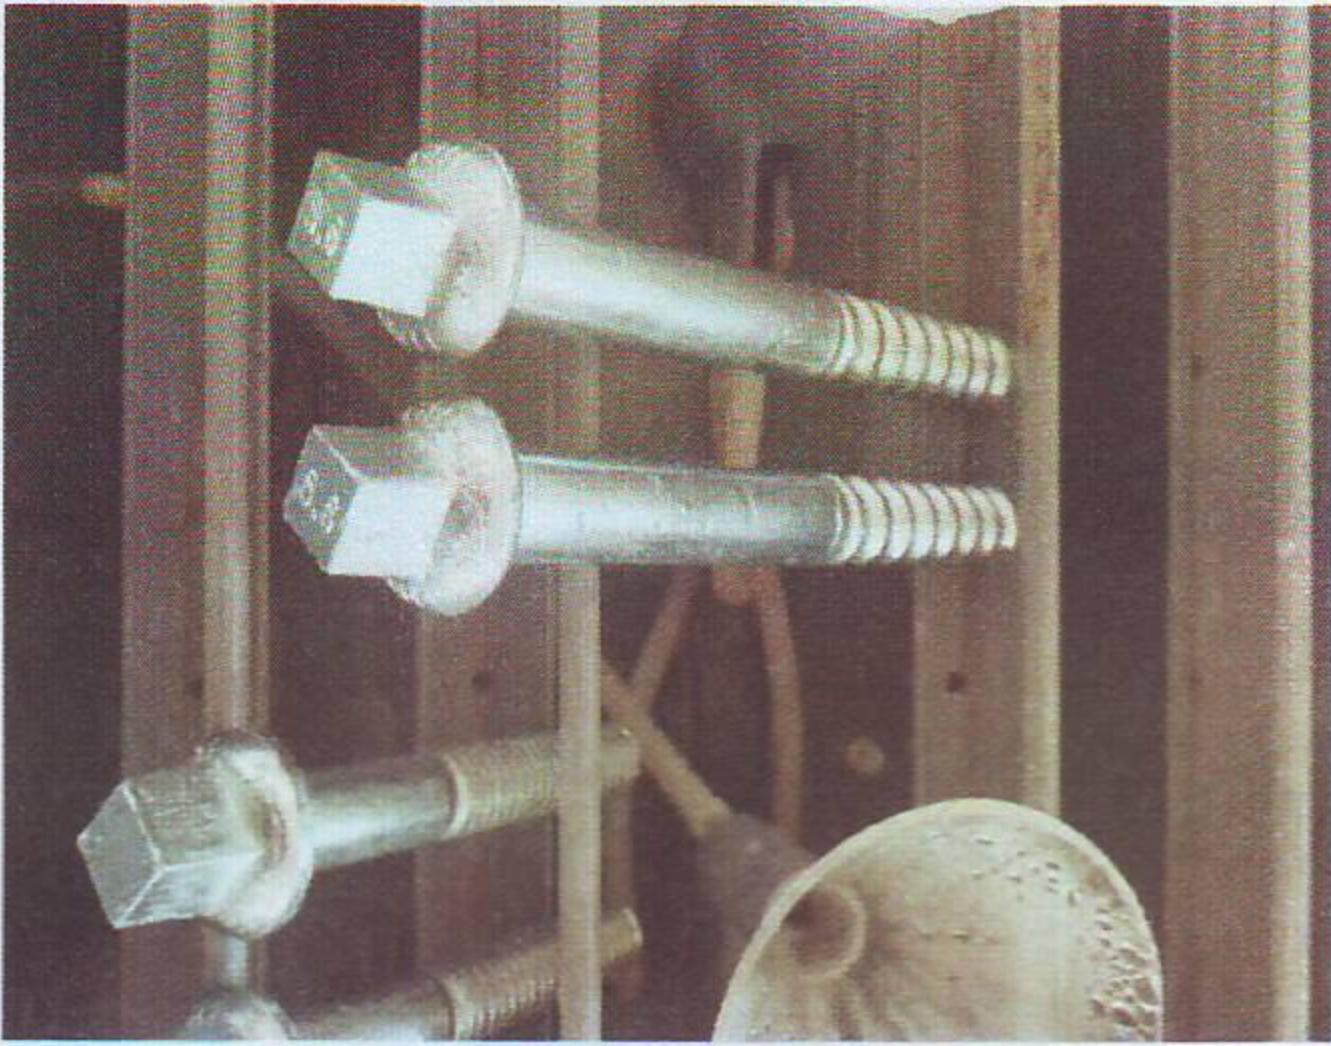

200小时无红锈
Photo showing no red rust



检验结果：
Result: 合格
PASSED

检测员：张全恢
Inspector:Mr. Zhang

审核：杨黎程
Approver:Mr. Yang
